

— PLANEJAMENTO EXECUTIVO • 2026

Tozi *Imobiliária*

IA de Atendimento + Processos Internos + Site — planejamento completo do projeto com cronograma, marcos, treinamentos e entregáveis.

R\$ 11.3k

MENSAL

36

MESES

10

MARCOS

3

FRENTES

Três frentes *estratégicas*

IA Atendimento, IA Processos Internos e Site operando em paralelo com entregas progressivas.

R\$ 5.600

IA ATENDIMENTO / MÊS

R\$ 4.850

IA PROCESSOS / MÊS

R\$ 850

SITE / MÊS

FRENTE	INVESTIMENTO	IMPLANTAÇÃO	FOCO
IA Atendimento	R\$ 5.600/mês	12 meses (ciclo 1)	SDR Passivo, Follow-up, SDR Ativo, VoxIA
IA Processos Internos	R\$ 4.850/mês	6 meses	Financeiro, Jurídico, Gestão
Site	R\$ 850/mês	Incluído	Criação e manutenção

Contexto: O SDR Passivo (Locação) já foi entregue em janeiro/2026 e está parcialmente ativo. A próxima fase retoma e expande esse trabalho.

Reuniões e *comunicação*

Sprints semanais com validação ao final de cada entrega. Documentação técnica atualizada continuamente.

REUNIÃO	FREQUÊNCIA	DURAÇÃO	PARTICIPANTES	OBJETIVO
Kickoff	Única (16/03)	1h30	Paulo + Gestão Tozi	Alinhamento geral, acessos, cronograma
Weekly	Toda segunda	30min	Paulo + Ponto focal	Status, bloqueios, próximos passos
Review de Fase	A cada marco	1h	Paulo + Gestão	Demo, feedback, aceite
Treinamento	Por módulo	1h-2h	Paulo + Usuários	Capacitação prática
Retro Trimestral	A cada 3 meses	1h	Paulo + Gestão	Métricas, ajustes, roadmap

Canais de Comunicação

Canal principal Grupo WhatsApp (Simplex + Tozi)

Documentação Pasta compartilhada

Demandas técnicas Tickets via ChatWoot ou email

Urgências WhatsApp direto com Paulo

SDR Passivo e *Follow-up*

Fase 1: SDR Passivo — Reativação e Expansão

16/03 a 10/04/2026 — Semanas 1-4

SEM.	PERÍODO	ATIVIDADES	ENTREGÁVEL
S1	16-20/03	Kickoff geral; Revisão dos fluxos (Clara, Atribuidor, Copiloto); Levantamento de ajustes	Ata de kickoff; Lista de ajustes
S2	23-27/03	Ajustes na IA (prompts, fluxos); Reativação SDR Passivo Locação; Testes controlados	SDR Locação reativado
S3	30/03-03/04	Mapeamento Vendas; Ajuste de prompts e rotas; Config times ChatWoot	SDR expandido para Vendas
S4	06-10/04	Mapeamento Jurídico e Financeiro; Config rotas e triagem; Ativação completa	SDR ativo em todos os depts

● **Marco M1 — 10/04: SDR Passivo ativo em todos os departamentos**

Treinamento T1 (semana de 06/04): Equipe Locação + Vendas — Clara, leads, Copiloto (1h)

Fase 2: Follow-up Automatizado

13/04 a 08/05/2026 — Semanas 5-8

SEM.	PERÍODO	ATIVIDADES	ENTREGÁVEL
S5	13-17/04	Critérios de ociosidade; Fluxos de follow-up; Mensagens por cenário	Regras de follow-up aprovadas
S6	20-24/04	Gatilhos automáticos (cron + ChatWoot); Limites de tentativas	Workflow n8n de follow-up
S7	27/04-01/05	Testes com dados reais; Monitoramento; Ajustes	Follow-up em teste controlado
S8	04-08/05	Ajustes finais; Ativação oficial	Follow-up ativo

● **Marco M2 — 08/05: Follow-up automatizado ativo**

Treinamento T2 (semana de 04/05): Equipe — acompanhamento de follow-ups (30min)

SDR Ativo e *BDR*

Fase 3: SDR Ativo / BDR — Estruturação

11/05 a 05/06/2026 — Semanas 9-12

SEM.	PERÍODO	ATIVIDADES	ENTREGÁVEL
S9	11-15/05	Organização base de leads; Segmentos e prioridades; Limpeza	Base organizada e segmentada
S10	18-22/05	Abordagem IA por segmento; Scripts/prompts; Fluxos n8n	Prompts e fluxos prontos
S11	25-29/05	Config disparos; Integração ChatWoot; Testes amostra	Disparos testados
S12	01-05/06	Início prospecção ativa; Monitoramento	BDR operando

● Marco M3 — 05/06: BDR/SDR Ativo operando

Treinamento T3 (semana de 01/06): Equipe comercial — pipeline de conversão (1h)

Fase 4: BDR — Ajustes Operacionais

08/06 a 03/07/2026 — Semanas 13-16

SEM.	PERÍODO	ATIVIDADES	ENTREGÁVEL
S13	08-12/06	Monitoramento de respostas e métricas	Relatório de performance
S14	15-19/06	Ajustes de abordagem baseados em dados	Prompts refinados
S15	22-26/06	Refinamento de qualificação	Critérios atualizados
S16	29/06-03/07	Estabilização do fluxo ativo	BDR estável

● Marco M4 — 03/07: BDR estabilizado

VoxIA — Atendimento *por Voz*

Fase 5: VoxIA — Estrutura Técnica

06/07 a 31/07/2026 — Semanas 17-20

SEM.	PERÍODO	ATIVIDADES	ENTREGÁVEL
S17	06-10/07	Config infraestrutura de voz (provider, telefonia, APIs)	Infraestrutura provisionada
S18	13-17/07	Integração com ChatWoot/n8n	Integração funcional
S19	20-24/07	Fluxo de atendimento receptivo por voz	Fluxo receptivo pronto
S20	27-31/07	Testes técnicos de qualidade e compreensão	Relatório de testes

Fase 6: VoxIA — Ativação Receptiva

03/08 a 28/08/2026 — Semanas 21-24

SEM.	PERÍODO	ATIVIDADES	ENTREGÁVEL
S21	03-07/08	Ajustes de linguagem e tom de voz	Voz calibrada
S22	10-14/08	Testes com cenários reais	Relatório de acurácia
S23	17-21/08	Correções finais	Sistema ajustado
S24	24-28/08	Ativação oficial atendimento por voz	VoxIA Receptivo ativo

● Marco M5 — 28/08: VoxIA Receptivo ativo

Treinamento T4 (semana de 24/08): Equipe — atendimento por voz, escalamento humano (1h)

VoxIA Ativo e *Consolidação*

Fase 7: VoxIA — Chamadas Ativas

31/08 a 23/10/2026 — Semanas 25-32

PERÍODO	ATIVIDADES	ENTREGÁVEL
31/08-11/09 (S25-26)	Definição de roteiros; Config campanhas	Roteiros e campanhas
14/09-25/09 (S27-28)	Testes de chamadas ativas; Ajustes	Chamadas testadas
28/09-09/10 (S29-30)	Início oficial + monitoramento	VoxIA Ativo operando
12/10-23/10 (S31-32)	Ajustes de performance; Estabilização	VoxIA completo

● **Marco M6 — 23/10: VoxIA Completo (ativo + receptivo)**

Fase 8: Consolidação

26/10/2026 a 13/03/2027 — Semanas 33-52

PERÍODO	MÊS	FOCO
26/10-20/11	Mês 9	Ajustes integrados SDR + BDR + VoxIA; Padronização
23/11-19/12	Mês 10	Refinamento operacional: scripts, triagem, otimizações
22/12-16/01/27	Mês 11	Estabilização geral: correções, testes de carga, ajustes finos
19/01-13/03/27	Mês 12	Monitoramento contínuo; Prep. ciclo 2

● **Marco M7 — 13/03/2027: Ciclo 1 completo**

Financeiro e *Jurídico*

Esta frente roda **em paralelo** com a IA Atendimento.

Fase A: Financeiro

16/03 a 08/05/2026 — Semanas 1-8

PERÍODO	ATIVIDADES	ENTREGÁVEL
16-27/03 (S1-2)	Mapeamento processos financeiros; Integração sistema imobiliário; Contas a receber	Documento de processos + integração
30/03-10/04 (S3-4)	Geração automática cobranças; Lembretes pós-vencimento	Automação cobrança ativa
13-24/04 (S5-6)	Conciliação bancária automática; Cruzamento contratos x extratos	Conciliação automatizada
27/04-08/05 (S7-8)	Repasse ao proprietário; Projeção fluxo de caixa	Financeiro automatizado

● **Marco MA — 08/05: Financeiro automatizado**

Treinamento TA (semana de 04/05): Equipe financeira — operação do novo fluxo (2h)

Fase B: Jurídico

11/05 a 03/07/2026 — Semanas 9-16

PERÍODO	ATIVIDADES	ENTREGÁVEL
11-22/05 (S9-10)	Modelos contratuais padrão; Parametrização cláusulas variáveis	Modelos prontos
25/05-05/06 (S11-12)	Geração automática contratos; Assinatura digital	Contratos automatizados
08-19/06 (S13-14)	Leitura inteligente contratos; Comparação com modelo padrão	IA análise contratual
22/06-03/07 (S15-16)	Controle de prazos; Gestão inadimplência	Jurídico estruturado

● **Marco MB — 03/07: Jurídico automatizado**

Treinamento TB (semana de 29/06): Equipe jurídica — contratos e prazos (2h)

Gestão e *Inteligência*

Fase C: Gestão


06/07 a 28/08/2026 — Semanas 17-24

PERÍODO	ATIVIDADES	ENTREGÁVEL
06-17/07 (S17-18)	Indicadores estratégicos; Consolidação base de dados	KPIs + base unificada
20-31/07 (S19-20)	Dashboards executivos; Integração financeiro + jurídico	Dashboards operacionais
03-14/08 (S21-22)	Relatórios automáticos mensais	Relatórios configurados
17-28/08 (S23-24)	Análise preditiva (inadimplência, risco, fluxo de caixa)	Análise preditiva ativa

● **Marco MC — 28/08: Gestão com IA ativa**

Treinamento TC (semana de 24/08): Gestão — dashboards e previsões (1h30)

Visão Geral — *Timeline*

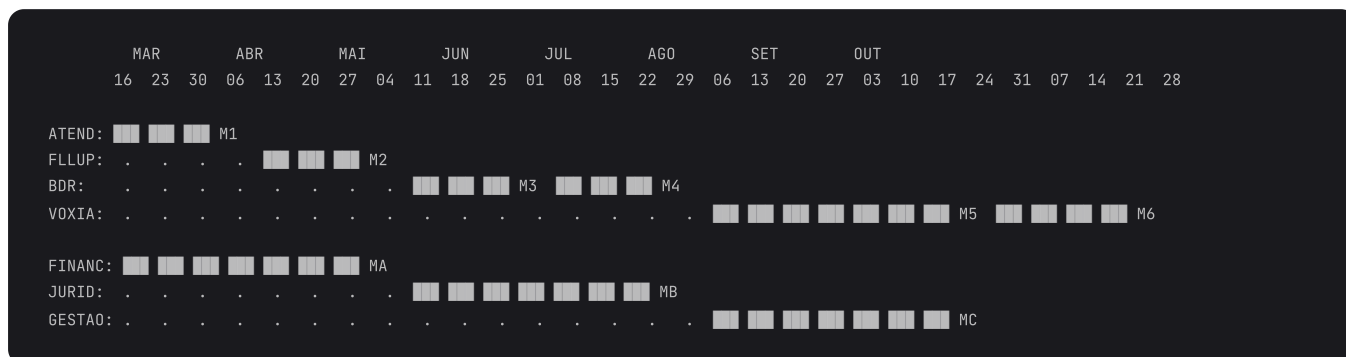

Marcos e *datas-chave*

#	MARCO	DATA	FRENTE	CRITÉRIO DE ACEITE
M1	SDR Passivo completo	10/04	Atendimento	Clara atendendo Locação, Vendas, Jurídico, Financeiro
M2	Follow-up automatizado	08/05	Atendimento	Leads ociosos recebendo recontato automático
M3	BDR operando	05/06	Atendimento	Prospecção ativa gerando leads qualificados
M4	BDR estabilizado	03/07	Atendimento	Métricas de conversão estáveis
M5	VoxIA Receptivo	28/08	Atendimento	Ligações atendidas por IA com qualidade
M6	VoxIA Completo	23/10	Atendimento	Chamadas ativas gerando resultados
M7	Ciclo 1 completo	13/03/27	Atendimento	Operação estável, métricas consolidadas
MA	Financeiro automatizado	08/05	Processos	Cobrança, conciliação e repasse automáticos
MB	Jurídico automatizado	03/07	Processos	Contratos gerados e monitorados por IA
MC	Gestão com IA	28/08	Processos	Dashboards e análise preditiva operacionais

Calendário de *treinamentos*

#	TREINAMENTO	PÚBLICO	DURAÇÃO	DATA	FORMATO
T1	SDR Passivo + Copiloto	Locação + Vendas	1h	06/04	Presencial + gravação
T2	Follow-up	Equipe comercial	30min	04/05	Call + doc
T3	BDR / Prospecção	Equipe comercial	1h	01/06	Presencial
T4	VoxIA	Equipe geral	1h	24/08	Presencial
TA	Financeiro	Equipe financeira	2h	04/05	Hands-on
TB	Jurídico	Equipe jurídica	2h	29/06	Hands-on
TC	Dashboards e Gestão	Diretoria	1h30	24/08	Demo

Riscos e *mitigações*

RISCO	IMPACTO	PROB.	MITIGAÇÃO
Resistência da equipe ao uso da IA	Alto	Média	Treinamento prático, envolvimento desde kickoff, benefícios concretos
API Vista com limitações	Médio	Média	Mapear endpoints na S1 (16-20/03), alternativas via scraping
Qualidade da IA abaixo do esperado	Alto	Baixa	Monitoramento contínuo, ajustes de prompt, evaluation automatizado
Atraso no fornecimento de info pela Tozi	Médio	Média	Ponto focal definido, SLA de 48h para solicitações
VoxIA com custos adicionais	Médio	Alta	Levantar custos até 10/07, aprovar antes de contratar
Integração financeira com legado	Alto	Média	Mapeamento até 27/03, validar viabilidade técnica

Dependências da *Tozi*

O QUE	ATÉ QUANDO	RESPONSÁVEL
Acessos ao sistema imobiliário (financeiro/jurídico)	16/03 (kickoff)	TI Tozi
Extratos bancários / acesso a contas	13/04	Financeiro Tozi
Aprovação de scripts de follow-up	13/04	Gestão Tozi
Modelos de contrato atuais	11/05	Jurídico Tozi
Base de leads para prospecção ativa	11/05	Comercial Tozi
Aprovação de scripts de prospecção	18/05	Gestão Tozi
Número telefônico para VoxIA	06/07	Gestão Tozi

Métricas e *metas*

IA ATENDIMENTO

MÉTRICA	BASELINE	META JUN/26	META SET/26	META MAR/27
Tempo 1ª resposta	~15min (manual)	< 30s	< 30s	< 30s
Leads qualificados auto	0%	70%	85%	90%
Conversão lead → visita	A medir	+10%	+20%	+30%
Leads recuperados follow-up	0	5/sem	10/sem	15/sem
Atendimentos voz/dia	0	0	10 recept.	20 total

IA PROCESSOS INTERNOS

MÉTRICA	BASELINE	META MAI/26	META JUL/26	META SET/26
Emissão de contrato	Manual (horas)	—	5 min	2 min
Conciliação bancária	Manual (dias)	Automática	—	—
Repasse proprietário	Manual	Automático	—	—
Prazos monitorados	0%	—	100%	100%
Dashboards ativos	0	0	0	3+

Documentação e *relatórios*

DOCUMENTAÇÃO POR FASE

#	ENTREGÁVEL	DESCRIÇÃO
1	Guia do usuário	Como usar o módulo (linguagem não-técnica)
2	Documentação técnica	Fluxos, APIs, configurações (para manutenção)
3	Vídeo de treinamento	Gravação da sessão de capacitação
4	Relatório de entrega	O que foi feito, métricas iniciais, próximos passos

RELATÓRIOS RECORRENTES

TIPO	FREQUÊNCIA	CONTEÚDO
Status Semanal	Toda segunda-feira	O que foi feito, próxima semana, bloqueios
Relatório Mensal	1ª segunda do mês	Métricas: leads, conversão, tempo resposta, qualidade IA
Review Trimestral	A cada 3 meses	Resultados vs. expectativas, ajustes estratégicos

RETROSPECTIVAS TRIMESTRAIS

#	DATA	ESCOPO
Q1	08/06/2026	SDR Passivo + Follow-up + início BDR + Financeiro
Q2	31/08/2026	BDR + VoxIA + Jurídico + Gestão
Q3	23/11/2026	Consolidação geral
Q4	13/03/2027	Ciclo 1 completo, planejamento ciclo 2

Ações *imediatas*

Tarefas que precisam acontecer antes ou durante a semana de kickoff.

#	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
1	Assinatura do contrato	Gestão Tozi + Simplex	16/03
2	Reunião de kickoff	Paulo	16/03
3	Definir ponto focal Tozi	Gestão Tozi	16/03
4	Solicitar acessos (financeiro, jurídico)	Ponto focal Tozi	16/03
5	Criar grupo WhatsApp	Paulo	16/03
6	Enviar cronograma ao cliente	Paulo	13/03

Datas-chave *resumo*

DATA	EVENTO
16/03/2026	Início do projeto / Kickoff
10/04/2026	Marco M1: SDR Passivo completo
08/05/2026	Marco M2 + MA: Follow-up + Financeiro
05/06/2026	Marco M3: BDR operando
08/06/2026	Retro Q1 (trimestre 1)
03/07/2026	Marco M4 + MB: BDR estável + Jurídico
28/08/2026	Marco M5 + MC: VoxIA Receptivo + Gestão
23/10/2026	Marco M6: VoxIA Completo
13/03/2027	Marco M7: Ciclo 1 completo / Retro Q4

Vamos *começar.*

3 frentes. 10 marcos. 36 meses.
Início em 16 de março de 2026.



contato@simplexsolucoes.com.br
